

和静县和静镇乡村科普馆建设项目支出 绩效评价报告

委托单位：和静县财政局

主管单位：和静县和静镇人民政府

实施单位：和静县和静镇人民政府

评价机构：新疆国融赛文企业管理咨询服务管理有限公司

主评人：屈伟

报告时间：2022年7月30日



目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 摘 要 | 1 |
| 一、基本情况 | 5 |
| (一) 项目概况 | 5 |
| (二) 项目资金安排及使用情况 | 7 |
| (三) 项目组织情况及实施进展情况 | 10 |
| (四) 项目绩效目标情况 | 10 |
| (五) 绩效自评情况及结论 | 11 |
| 二、绩效评价组织情况 | 11 |
| (一) 绩效评价的目的 | 11 |
| (二) 绩效评价依据 | 12 |
| (三) 绩效评价工作程序及方法 | 13 |
| (四) 绩效评价指标体系及标准 | 15 |
| (五) 绩效评价抽样情况 | 16 |
| 三、绩效评价综合情况及结论 | 17 |
| (一) 绩效评价综合结论 | 17 |
| (二) 绩效目标实现情况 | 17 |
| 四、绩效评价情况分析 | 17 |
| (一) 决策情况分析 | 18 |
| (二) 过程情况分析 | 20 |
| (三) 产出情况分析 | 23 |
| (四) 效益情况分析 | 24 |
| 五、主要经验及做法 | 26 |
| 六、存在问题及原因分析 | 26 |
| 七、针对问题提出的建议 | 26 |
| 八、绩效评价结果应用建议 | 27 |
| 九、其他需说明的情况 | 28 |
| 附件 1: 综合评分表 | 30 |
| 附件 2: 工作底稿 | 32 |
| 附件 3: 访谈报告 | 51 |
| 附件 4: 满意度调查问卷报告 | 53 |

摘 要

受和静县财政局委托，新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司于2022年7月14日至2022年7月30日对和静县财政局管理的和静镇乡村科普馆建设项目开展绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

为完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深入实施“文化润疆”工程，助力乡村振兴，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州立足科普工作的群众性、社会性和经常性，以提升各族群众科学文化素质为根本，充分发挥科协组织在政治引领、创新发展、民族团结、社会稳定等方面的积极作用，探索在全州乡村推行科技传播的大科普工作机制，以乡村科普馆为阵地，引导各族群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，增进各民族对中华民族的自觉认同，真正让科技与广大农民零距离接触，让乡村科普馆成为服务群众、教育群众，引领科学文明新风的载体和平台。

乡村科普馆是提升农牧民群众科学素养和文明程度的主阵地，是普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、讲好科学故事的重要平台，是科技文化助力“文化润疆”工程的主要载体。承担着教育群众、引领群众、服务群众、凝聚群众，提升全民科学素质，助力乡村振兴的重要作用。

农牧民在参观科普馆过程中不仅增长了专业知识，还为增收致富提供了有力的技术支撑。通过参观科普馆，学习掌握更加专业的农业技术，运用科学的种植、养殖技术，采取高标准科学化化管理，增加收入。

二、绩效评价综合情况及结论

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对和静镇乡村科普馆建设项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为88.07分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为15分，得分为11分，得分率为73.33%。项目过程类指标权重为25分，得分为21.8分，得分率为87.2%。项目产出类指标权重为40分，得分为39.08分，得分率为97.7%。项目效益类指标权重为20分，得分为16.19分，得分率为80.95%。

三、主要经验及做法

1. 参照单位《项目资金管理办法》，严控资金的拨付使用。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。资金支出实行先审批再使用制度。按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实，合规，完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。

2. 领导重视，组织机构健全。在村社区中选出具有较强的

科教兴社意识、热心科教事业的村社区成员和居民代表，组成村社区科普宣使员和志愿者服务队，构建了村社区科普工作队，有效地保证了村、社区科普馆及科普工作的开展。

四、存在问题

1. 项目立项粗放，备案材料不够完备。项目立项论证不够完备，缺乏项目申请报告文本、建设资金落实证明文件等文件支撑。该项目只有相关资金申请文件，就本项目并未形成规范的书面论证文件，且相关备案材料未见归档，项目立项流程比较粗放。

2. 档案归档不完备。项目立项过程粗放，绩效意识较差，导致档案立项资料及绩效资料不够完备。

3. 科普活动不够丰富。与日益丰富的社会活动相比，科普活动相对显得比较单一。

五、相关建议

针对和静镇乡村科普馆建设项目绩效评价开展情况提出的建议、意见包括：

1. 与专业主管部门加强沟通，提升专业性项目监管机制的严谨性。建议项目单位今后申报专业性较强或涉及特种行业的项目时，加强对财政项目立项阶段的管理力度，保证项目相关决策论证性文件的编写与收集，对需专业审核或专业备案的项目，按有关程序报送专业主管部门进行前评或备案，进一步提高项目立项程序严谨性。

2. 和静镇人民政府应针对重点项目建立项目档案，上报审核的文件应及时归档保存，保证文件的完备性。同时应认真、细致地做好档案整理工作，杜绝文件档案管理混乱的现象。

3. 结合中华传统节日、科技纪念日、二十四节气等节日，制定活动计划，结合当地产业发展特色，民俗文化特色，农牧民科技需求等，积极谋划，开展各具特色的科普宣传，农牧民实用技术培训等科普活动。

六、绩效评价结果应用建议

总体来说，该项目开展工作良好，且绩效目标合理并符合和静县相关政策，做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金计划，不断提高资金使用效率。该项目绩效指标完成情况较好，建议以后保证财政资金对此类项目的投入，使财政资金达到最优化使用的效果。

和静镇乡村科普馆建设项目绩效评价报告

为检验和静县财政局管理的和静镇乡村科普馆建设项目资金使用绩效，考核资金预算绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，和静县财政局单位委托新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司作为第三方机构，按照《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（预算司〔2021〕6号）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等文件的有关规定，对“和静镇乡村科普馆建设项目”开展绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目单位基本情况

和静县和静镇人民政府职责主要包括：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。开展社会主义民主与法制教育，加强

社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

2. 立项背景及目的

为完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深入实施“文化润疆”工程，助力乡村振兴，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州立足科普工作的群众性、社会性和经常性，以提升各族群众科学文化素质为根本，充分发挥科协组织在政治引领、创新发展、民族团结、社会稳定等方面的积极作用，探索在全州乡村推行科技传播的大科普工作机制，以乡村科普馆为阵地，引导各族群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，增进各民族对中华民族的自觉认同，真正让科技与广大农民零距离接触，让乡村科普馆成为服务群众、教育群众，引领科学文明新风的载体和平台。

乡村科普馆是提升农牧民群众科学素养和文明程度的主阵地，是普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、讲好科学故事的重要平台，是科技文化助力“文化润疆”工程的主要载体。承担着教育群众、引领群众、服务群众、凝聚群众，提升全民科学素质，助力乡村振兴的重要作用。农牧民在参观科普馆过程中不仅增长了专业知识，还为增收致富提供了有力的技术支撑。通过参观科普馆，学习掌握更加专业的农业技术，运用科学的种植、养殖技术，采取高标准科学化化管理，增加收入。

3. 项目立项依据

(1) 《中国科协关于进一步加强农村科普工作的意见》(科协发普字〔2005〕67号)提出,以搭建农村社会化科普服务平台为主要工作方式,有效发挥科普工作主要社会力量的作用,动员、支持社会各方面力量共同开展科普工作,集成并共享科普资源,通过社会化的农村科普工作,普惠广大农民群众。

(2) 《全民科学素质行动计划纲要 2021-2035 年》提出,提升革命老区,民族地区,边疆地区,脱贫地区农民科技文化素质。引导社会科普资源向欠发达地区农村倾斜。开展兴边富民行动、边境边民科普活动和科普边疆行活动,大力开展科技援疆援藏,提高边远地区农民科技文化素质。提升农村低收入人口职业技能,增强内生发展能力。

(3) 《中华人民共和国科学技术普及法》第二十条规定,国家加强农村的科普工作。农村基层组织应当根据当地经济与社会发展的需要,围绕科学生产、文明生活,发挥乡镇科普组织、农村学校的作用,开展科普工作。各类农村经济组织、农业技术推广机构和农村专业技术协会,应当结合推广先进适用技术向农民普及科学技术知识。

(4) 《关于解决乡村科普馆启动建设资金的请示》(静党宣请字〔2021〕19号)

(二) 项目资金安排及使用情况

该项目总预算投入为 280 万元,均为财政资金。这笔资金

主要用于支付五个村，一个社区科普馆建设相关费用。

该项目合同价为 247.692397 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，该项目支付资金 214.90269 万元。具体资金支付情况见下表：

表 1-1 和静镇乡村科普馆建设项目资金使用情况表

| 村 | 内容 | 中标单位 | 金额（万元） | 支付金额（万元） | 备注 |
|--------|----------|----------------|-----------|----------|--|
| 新希望社区 | 广告设计安装 | 巴州传扬广告有限公司 | 6.100956 | 6.100956 | 根据合同付款方式直接支付 |
| | 科普馆装修装饰 | 新疆星乾晟坤建筑工程有限公司 | 45.897123 | 36.7176 | 根据合同分三期支付，第一期支付合同 80%即 36.7176 万元 |
| 巩哈尔村 | 科技发明展品定制 | 巴州学博商贸有限责任公司 | 36.044 | 36.044 | 验收 15 个工作日内，申请支付 |
| | 广告牌制作 | 巴州学博商贸有限责任公司 | 2.195 | 2.195 | 根据合同付款方式直接支付 |
| | 科普馆装修 | 和静县卓信建筑安装工程服务部 | 27.339075 | 21.87126 | 根据合同首次付款总额的 80%，剩余 20%待审计后支付 17%，质保期 1 年，1 年后支付 3% |
| | 室内装修 | 和静县卓信建筑安装工程服务部 | 14.42 | 11.536 | 根据合同首次付款总额的 80%，剩余 20%待审计后支付 20%，质保 1 年，质保期间乙方向甲方支付 3% 质保金 |
| 夏尔布鲁克村 | 科普馆维修改造 | 和静亚欣广告策划有限公司 | 23.668 | 18.9344 | 根据合同首次付款总额的 80%，剩余 20%待审计后支付 20%，质保 1 年，质保期间乙 |

| | | | | | |
|---------|----------|----------------|-----------|-----------|--|
| | | | | | 方向甲方支付 3% 质保金 |
| | 广告宣传定点服务 | 和静亚欣广告策划有限公司 | 6.332 | 6.332 | 根据合同付款方式直接支付 |
| 阿丽腾布鲁克村 | 科普馆维修改造 | 和静亚欣广告策划有限公司 | 19.940843 | 15.952674 | 根据合同首次付款总额的 80%，剩余 20%待审计后支付 20%，质保 1 年，质保期间乙方向甲方支付 3% 质保金 |
| | 广告宣传定点服务 | 和静亚欣广告策划有限公司 | 5.932 | 5.932 | 根据合同付款方式直接支付 |
| 查汗通沟村 | 科普馆维修改造 | 和静县铭浩建筑安装工程服务部 | 21.886 | 17.5088 | 根据合同首次付款总额的 80%，剩余 20%待审计后支付 20%，质保 1 年，质保期间乙方向甲方支付 3% 质保金 |
| | 广告牌制作 | 巴州学博商贸有限责任公司 | 2.89 | 2.89 | 根据合同付款方式直接支付 |
| | 设备采购 | 巴州学博商贸有限责任公司 | 5.218 | 5.218 | 验收合格、到货及时，直接支付 |
| | 设备 | 巴州巨和广告装饰有限公司 | 10.6878 | 10.6878 | 验收合格、到货及时，直接支付 |
| 克再村 | 科普馆维修改造 | 巴州巨和广告装饰有限公司 | 10.797 | 8.6376 | 根据合同首次付款总额的 80%，剩余 20%待审计后支付 20%，质保 1 年，质保期间乙方向甲方支付 3% 质保金 |
| | 广告服务 | 巴州巨和广告装饰有限公司 | 8.3446 | 8.3446 | 根据合同付款方式直接支付 |

| | | | |
|----|------------|-----------|--|
| 共计 | 247.692397 | 214.90269 | |
|----|------------|-----------|--|

注：数据来源于合同、竣工验收报告、记账凭证、财政直接支付凭证

（三）项目组织情况及实施进展情况

1. 项目组织情况

为确保和静县和静镇人民政府该项目的顺利实施，和静县和静镇人民政府成立项目实施小组，组长：惠满发书记，副组长：巴力江·牙生镇长，王新柱副镇长、项目负责人为王新龙办公室，成员为朱英、巴都木加甫、2人，其中：巴力江·牙生负责监督跟进项目进度，王新柱负责与项目施工人员联系协商相关事宜工作，朱英负责收集基础资料、科普馆建设项目资金申报工作。

2. 项目实施进展情况

该项目顺利实施，按照县党委安排部署，为进一步深化群众工作，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，结合新时代文明实践中心（所、站、点）建设，实施文化润疆工程，在和静镇巩哈拉村、阿力腾布鲁克村、夏尔布鲁克村、克再村、查汗通古村、建设科普馆。

并提出资金申请，《关于解决乡村科普馆启动建设资金的请示》（静党宣请字〔2021〕19号）。各村科普馆项目均已验收完毕，广告设计，制作、展品定制、设备采购类，验收完毕，资金已支付完毕，其余项目按照合同要求支付资金，待审计完成后，支付剩余资金。

（四）项目绩效目标情况

总目标：结合新时代文明实践中心（所、站、点）建设，实施文化润疆工程，在和静镇巩哈拉村、阿力腾布鲁克村、夏尔布鲁克村、克再村、查汗通古村建设科普馆，受益本村本乡牧民群众，为发展旅游业带来了效益，提高了牧民文化知识。

阶段性目标：目标 1：装备乡镇科普馆数量 5 座。目标 2：通过项目的开展，提升基层群众服务水平，使基层新时代文明实践示范站成为教育、引领、凝聚和服务各族群众的阵地。

（五）绩效自评情况及结论

和静镇乡村科普馆建设项目，申请《关于解决乡村科普馆启动建设资金的请示》（静党宣请字〔2021〕19 号），开展此项目，并及时开展 2021 年绩效自评。完成项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告最终自评得分为 98.88，自评等级为“优”。

本次绩效自评结果真实、合理、科学，最终得分结果与资金执行情况匹配度一般，整体完成情况与项目计划相符，资金执行进度有待提高。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价的目的

为了全面了解和静镇乡村科普馆建设项目的资金使用情况以及取得的综合绩效，以便总结项目实施经验，发现项目过

程中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，新疆国融赛文企业管理咨询有限公司对和静镇乡村科普馆建设项目进行绩效评价。

通过资料收集、访谈、数据统计分析等形式，总结本项目的经验，发现资金管理和项目过程中存在的问题并分析产生原因，提出有针对性的合理化建议。以提高今后其他项目或者类似项目的经费的使用效率及效益。

（二）绩效评价依据

表 2-1 绩效评价依据清单表

| 依据类别 | 文件名称 |
|--------|--|
| 制度管理方面 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号） 2. 关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知 3. 《自治州本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》的通知 4. 《中华人民共和国预算法》 5. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号） |
| 资金拨付方面 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于解决乡村科普馆启动建设资金的请示》（静党宣请字〔2021〕19号） 2. 合同、竣工验收报告、记账凭证、财政直接支付凭证 |
| 项目管理方面 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目支出绩效目标表、项目支出绩效5月、8月监控表、项目支出绩效自评表、项目支出绩效自评报告。 2. 项目采购、施工合同 3. 项目验收单 4. 施工许可证 |

| | |
|--------|---|
| 项目立项方面 | 1. 《中国科协关于进一步加强农村科普工作的意见》（科协发普字〔2005〕67号） 2. 《全民科学素质行动计划纲要 2021-2035 年》 3. 《中华人民共和国科学技术普及法》 |
|--------|---|

（三）绩效评价工作程序及方法

根据关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知财监〔2021〕4号规定，受托第三方机构独立开展评价。

1. 绩效评价工作程序

（1）按照规定要求和文本格式，撰写预算绩效评价报告初稿，力求做到逻辑清晰、内容完整、依据充分、数据详实、分析透彻、结论准确、建议可行。

（2）评价报告初稿撰写完成后，第三方机构应当书面征求被评价对象和委托方的意见。委托方或被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行评议，向第三方机构反馈书面意见。第三方机构应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。

（3）指定内部有关职能部门或者专门人员，对修改后的评价报告进行内部审核。

（4）经内部审核通过的评价报告，由该项目主评人签名，加盖第三方机构公章后，形成正式评价报告，提交委托方。

2. 评价方法

制定实施方案本次评价指标中，既有定性指标又有定量指

标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对和静镇乡村科普馆建设项目完成情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对和静镇乡村科普馆建设项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

（3）公众评判法

我们通过调查问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。对和静镇乡村科普馆建设项目群众满意度问卷采取随机抽样法，对相关受益群体发放问卷，确保样本的随机性与准确性。并针对群众的满意程度设立问题，并根据相关问题在问卷总数所占比进行具体评价。

综合评分：根据单独的评分结果汇总平均，得出本项目的最终评分结果。

（四）绩效评价指标体系及标准

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请若干专家对指标体系中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

（2）确定权重

采用专家调查法，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）第十四条要求，财政和部门评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。

同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

此项目，项目决策权重为 0.15，项目过程权重占 0.25，项目产出权重占 0.40，项目效益权重占 0.20。

(3) 确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。本次绩效评价采用计划标准、通用标准、历史标准等确定此次绩效评价标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

| 评价计分结果 | 评价结果级别 |
|------------|--------|
| 90 分~100 分 | 优 |
| 80 分~90 分 | 良 |
| 60 分~80 分 | 中 |
| 60 分以下 | 差 |

(五) 绩效评价抽样情况

和静镇乡村科普馆建设项目总预算投入为 280 万元，其中财政资金 280 万元。项目实施范围仅涉及和静县和静镇人民政府，所以该项目仅有一个项目点，本次绩效评价抽样占比为 100%。

三、绩效评价综合情况及结论

(一) 绩效评价综合结论

运用由项目组研究并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对和静镇乡村科普馆建设项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 88.07 分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为 15 分，得分为 11 分，得分率为 73.33%。项目过程类指标权重为 25 分，得分为 21.8 分，得分率为 87.2%。项目产出类指标权重为 40 分，得分为 39.08 分，得分率为 97.7%。项目效益类指标权重为 20 分，得分为 16.19 分，得分率为 80.95%。具体打分情况见附件 1 综合评分表，各指标打分情况及依据见附件 2 工作底稿。

表 3-1 和静镇乡村科普馆建设项目
绩效得分情况表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
|-----|--------|-------|-------|--------|--------|
| 权重 | 15 | 25 | 40 | 20 | 100 |
| 分值 | 11 | 21.8 | 39.08 | 16.19 | 88.07 |
| 得分率 | 73.33% | 87.2% | 97.7% | 80.95% | 88.07% |

(二) 绩效目标实现情况

根据项目绩效目标，和静镇乡村科普馆建设项目按计划顺利实施，结合新时代文明实践中心（所、站、点）建设，实施文化润疆工程，在和静镇巩哈拉村、阿力腾布鲁克村、夏尔布鲁克村、克再村、查汗通古村建设科普馆，受益本村本乡牧民群众，为发展旅游业带来了效益，提高了牧民文化知识。

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

项目决策指标是从项目的战略目标适应性、立项规范性与绩效目标合理性三个方面来对项目决策方面进行考察。项目决策类指标分值 15 分，实际得分 11 分。指标的得分情况如表 4-1 所示。

表 4-1 项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
|--------------|----|-----|------|------|-----|
| A101 战略目标适应性 | 5 | 适应 | 适应 | 100% | 5 |
| A102 立项规范性 | 5 | 规范 | 不够规范 | 30% | 1.5 |
| A201 绩效目标合理性 | 5 | 合理 | 不够合理 | 90% | 4.5 |

对于“**A101 战略目标适应性**”：（1）《中国科协关于进一步加强农村科普工作的意见》（科协发普字〔2005〕67号）提出，以搭建农村社会化科普服务平台为主要工作方式，有效发挥科普工作主要社会力量的作用，动员、支持社会各方面力量共同开展科普工作，集成并共享科普资源，通过社会化的农村科普工作，普惠广大农民群众。《中华人民共和国科学技术普及法》第二十条规定，国家加强农村的科普工作。农村基层组织应当根据当地经济与社会发展的需要，围绕科学生产、文明生活，发挥乡镇科普组织、农村学校的作用，开展科普工作。各类农村经济组织、农业技术推广机构和农村专业技术协会，应当结合推广先进适用技术向农民普及科学技术知识。因此，本项目的实施符合发展政策，该项得 1.5 分。（2）《全民科

学素质行动计划纲要 2021-2035 年》提出，提升革命老区，民族地区，边疆地区，脱贫地区农民科技文化素质。引导社会科普资源向欠发达地区农村倾斜。开展兴边富民行动、边境边民科普活动和科普边疆行活动，大力开展科技援疆援藏，提高边远地区农民科技文化素质。提升农村低收入人口职业技能，增强内生发展能力。本项目的实施符合区域优先发展重点，该项得 1.5 分。（3）本项目的实施能支持和静县和静镇人民政府“加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。”职能的体现，该项得 2 分。根据评分细则，该指标得 5 分。

对于“**A102 立项规范性**”：（1）该项目缺少项目可行性研究报告，未见相关会议记录，立项文件缺少，该项扣除 2 分（2）项目的申请文件及立项依据符合规定程序，该项不扣分。（3）该项资金申请文件齐全，但缺少项目立项文件，项目申请批复资料，该项扣除 1.5 分。

依据评分细则，该指标得 1.5 分。

对于“**A201 绩效目标合理性**”：和静镇乡村科普馆建设项目设立了绩效目标，详情如下：装备乡镇科普馆数量 5 座，通过项目的开展，提升基层群众服务水平，使基层新时代文明实践示范站成为教育、引领、凝聚和服务各族群众的阵地。该项得 50%权重分。该项目绩效目标编制明确、可达成、具有相

关性和时限性。但效益指标“提升基层群众服务水平”“凝聚和服务各族群众”目标值设置“有效”“长期”，不可衡量，该项扣除 10%权重分。

根据评分规则，该指标得 4.5 分。

（二）过程情况分析

项目过程指标是从项目的预算编制合理性、预算资金到位情况、资金使用合规性、财务管理、组织机构、预算执行率、政府采购规范性、档案管理完备性八个方面来对项目实施进行考察。项目过程类指标分值 25 分，实际得分 21.8 分。指标的得分情况如表 4-2 所示。

表 4-2 项目过程指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
|---------------|----|-------|--------|--------|-----|
| B101 预算编制合理性 | 3 | 合理 | 不够合理 | 66.67% | 2 |
| B102 预算资金到位情况 | 3 | 足额、及时 | 足额、及时 | 100% | 3 |
| B103 资金使用合规性 | 3 | 合规 | 合规 | 100% | 3 |
| B104 财务管理 | 3 | 规范 | 规范 | 100% | 3 |
| B201 组织机构 | 3 | 健全，明确 | 健全，明确 | 100% | 3 |
| B202 预算执行率 | 3 | 100% | 76.75% | 76.75% | 2.3 |
| B203 政府采购规范性 | 4 | 规范 | 规范 | 100% | 4 |
| B204 档案管理完备性 | 3 | 完备 | 较完备 | 50% | 1.5 |

对于“B101 预算编制合理性”：①项目预算编制完整，该项得 1 分；②按照乡镇科普馆建设统计表进行编制，有明确、合理的单价标准和数量确定依据，该项得 1 分；③根据资料可

得，预算的编制与绩效目标设置的水平不太相符，项目申请预算资金 280 万元，实际招投标结束后，合同价为 247.692397 万元，有部分出入，该项扣除 1 分。

根据评分细则，该指标得 2 分。

对于“**B102 预算资金到位情况**”和静镇乡村科普馆建设项目，应到位预算资金为 280 万元，实际到位资金为 280 万元，资金到位率 100%，资金到位及时，资金拨付足额到位。

依据评分细则，该项得 3 分。

对于“**B103 资金使用合规性**”：①目前，各村科普馆项目均已验收完毕，广告设计，制作、展品定制、设备采购类，验收完毕，资金已支付完毕，其余项目按照合同要求支付资金，待审计完成后，支付剩余资金。支付情况均按照合同约定时间支付。故①项得 1 分；②一切开支，一律按照先报批后办办理的程序，提出资金申请《关于解决乡村科普馆启动建设资金的请示》（静党宣请字〔2021〕19 号）。资金的拨付有完整的审批程序和手续，故②项得 1 分；③该项目不存在预算调整情况，故③项得 0.5 分；④经核查会计资料，资金的使用符合合同规定的用途，故④项得 0.5 分；⑤该项目未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，故⑤项不扣分。

依据评分细则，该项指标得 3 分。

对于“**B104 财务管理**”：（1）和静镇乡村科普馆建设项目，财务制度健全。在《和静镇人民政府财务管理制度》中，

建设项目资金管理方面，明确了资金申请、拨付、审批等要求，财务制度健全，故①项得2分。（2）项目实施期间，和静镇人民政府严格执行财务收支审批、财务处理程序及财务信息公开等相关制度，财务制度健全故②项得1分。（3）拨款记录材料齐全，按要求保存会计凭证会计账簿和会计报表等所有会计核算的专业资料，会计核算规范，故③项得1分。根据指标评分细则，该指标得3分。

对于“**B201 组织机构**”：为确保和静县和静镇人民政府该项目的顺利实施，和静县和静镇人民政府成立项目实施小组，组长：惠满发书记，副组长：巴力江·牙生镇长，王新柱副镇长、项目负责人为王新龙办公室，成员为朱英、巴都木加甫、2人，其中：巴力江·牙生负责监督跟进项目进度，王新柱负责与项目施工人员联系协商相关事宜工作，朱英负责收集基础资料、科普馆建设项目资金申报工作。

该项目组织机构健全，分工明确，依据评分细则，该指标得3分。

对于“**B202 预算执行率**”：该项目申请预算资金为280万元，截至2021年12月，共支出214.9029万元。

预算执行率=214.9029/280=76.75%，依据评分细则，该指标得分=3*76.75%=2.3分。

对于“**B203 政府采购合规性**”：和静镇乡村科普馆建设项目五个村一个社区针对科普馆不同建设内容分别进行了招

标，项目的招标评标流程符合《中华人民共和国政府采购法》规定。和静镇乡村科普馆建设项目的工程合同条款详尽，符合《中华人民共和国合同法》的规定。均在规定时间内按照要求签订合同

政府采购流程均按照制度规定进行，未发现违规现象。根据评分细则，该指标得 4 分。

对于“B204 档案管理完备性”：和静镇乡村科普馆建设项目，缺少项目可行性研究报告，未见相关会议记录，立项文件缺少，故扣除 25%权重分，绩效管理的相关文件归档完整，管理制度文件缺少招投标文件，项目管理制度文件、故扣除 25%权重分，有资金申请及批复文件，资金拨付相关材料，根据评分细则，该指标得 1.5 分。

（三）产出情况分析

项目产出指标是从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面来对项目产出方面进行考察。项目产出指标分值 40 分，得分为 39.08 分。指标的得分情况如表 4-3 所示。

表 4-3 项目产出指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
|----------------|----|------|------|------|----|
| C101 装备乡村科普馆数量 | 8 | 5 座 | 5 座 | 100% | 8 |
| C201 项目验收合格率 | 8 | 100% | 100% | 100% | 8 |
| C301 项目计划开工率 | 8 | ≥95% | 100% | 100% | 8 |
| C302 项目计划完工率 | 8 | 100% | 100% | 100% | 8 |

| | | | | | |
|----------------|---|---------|-----------|--------|------|
| C401 乡村科普馆装备成本 | 8 | ≤56 万/座 | 49.54 万/座 | 88.50% | 7.08 |
|----------------|---|---------|-----------|--------|------|

对于“C101 装备乡村科普馆数量”：该项目目标值为装备乡村科普馆 5 座，根据项目验收资料，五个村，一个社区科普馆建设均已完成验收，实际完成业绩值为装备乡村科普馆 5 座，根据评分规则，得分=（5 座/5 座）×8=8 分。

对于“C201 项目验收合格率”：根据验收资料，验收合格，验收合格率达到 100%。

根据评分规则，得分=（100%/90%）×8=8 分。

对于“C301 项目计划开工率”：和静镇乡村科普馆建设项目按计划开工，依据评分细则，该指标得 8 分。

对于“C302 项目计划完工率”：根据项目验收资料，该项目五个村及一个社区科普馆建设均已验收完毕

根据评分规则，得分 8 分。

对于“C401 乡村科普馆装备成本”：和静镇乡村科普馆建设项目计划建设 5 座科普馆，预算 280 万元，每座科普馆 56 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际完成 5 座科普馆建设，投入资金 247.69 万元，每座科普馆 49.54 万元，根据评分细则，得分=（49.54/56）*8=7.08 分

（四）效益情况分析

项目效益指标是从社会效益、可持续影响效益、群众满意

度三个方面来对项目效益方面进行考察。项目绩效指标分值 20 分，实际得分 16.19 分。指标的得分情况如表 4-4 所示。

| 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
|-----------------|----|------|--------|--------|------|
| D101 提升基层群众服务水平 | 6 | 有效 | 达成目标 | 72.50% | 4.35 |
| D201 丰富群众科技文化知识 | 7 | 长期 | 达成目标 | 100% | 7 |
| D301 群众满意度 | 7 | ≥95% | 79.51% | 69.14% | 4.84 |

对于“D101 提升基层群众服务水平”：根据调查问卷中关于“7. 您对科普馆服务水平的评价是？”问题中，结果=(非常满意*100%+比较满意*60%+一般*30%+不满意*0%)*100%，结果 95%以上为满分，之后每降低 1%扣除 2%权重分，(不含)60%以下不得分。据问卷调查分析，结果=(53.23%*100%+46.77%*0.6+0%*0.3+0%*0%)*100%=81.29%，依据评分细则，该项目得分=6-(95%-81.29%)*(6*2%)=4.35。

对于“D201 丰富群众科技文化知识”：根据调查问卷中关于“您认为科普馆建设完成后，是否增长见识，学习了更多见识？”问题中，选择“是”的问卷占 95%以上为满分，之后每降低 1%扣除 2%权重分，(不含)60%以下不得分。据问卷调查分析，选择“是”的问卷占 100%，依据评分细则，该项目得分 7 分。

对于“D301 群众满意度”：根据调查问卷中关于“您对科普馆的整体评价是？”问题中，结果=(非常满意*100%+比较满意*60%+一般*30%+不满意*0%)*100%，结果 95%以上为满分，

之后每降低 1%扣除 2%权重分，（不含）60%以下不得分。据问卷调查分析，得分= $(50\%*100\%+48.39\%*0.6+1.61\%*0.3+0\%*0\%)*100\%=79.51\%$ ，依据评分细则，该项目得分= $7-(95\%-79.51\%)* (7*2\%) =4.84$ 。

五、主要经验及做法

1. 参照单位《项目资金管理办法》，严控资金的拨付使用。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。资金支出实行先审批再使用制度。按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实，合规，完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。

2. 领导重视，组织机构健全。在村社区中选出具有较强的科教兴社意识、热心科教事业的村社区成员和居民代表，组成村社区科普宣使员和志愿者服务队，构建了村社区科普工作队伍，有效地保证了村、社区科普馆及科普工作的开展。

六、存在问题及原因分析

1. 项目立项粗放，备案材料不够完备。项目立项论证不够完备，缺乏项目申请报告文本、建设资金落实证明文件等文件支撑。该项目只有相关资金申请文件，就本项目并未形成规范的书面论证文件，且相关备案材料未见归档，项目立项流程比较粗放。

2. 档案归档不完备。项目立项过程粗放，绩效意识较差，导致档案立项资料及绩效资料不够完备。

3. 科普活动不够丰富。与日益丰富的社会活动相比，科普活动相对显得比较单一。

七、针对问题提出的建议

1. 与专业主管部门加强沟通，提升专业性项目监管机制的严谨性。建议项目单位今后申报专业性较强或涉及特种行业的项目时，加强对财政项目立项阶段的管理力度，保证项目相关决策论证性文件的编写与收集，对需专业审核或专业备案的项目，按有关程序报送专业主管部门进行前评或备案，进一步提高项目立项程序严谨性。

2. 和静镇人民政府应针对重点项目建立项目档案，上报审核的文件应及时归档保存，保证文件的完备性。同时应认真、细致地做好档案整理工作，杜绝文件档案管理混乱的现象。

3. 结合中华传统节日、科技纪念日、二十四节气等节日，制定活动计划，结合当地产业发展特色，民俗文化特色，农牧民科技需求等，积极谋划，开展各具特色的科普宣传，农牧民实用技术培训等科普活动。

八、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效

益的重要手段。未来要更加注重绩效评价结果，在门户网站上及时公开预决算相关资料以及绩效评价结果。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反映项目实施的效益。评价分为4个档次：分为优（90分~100分）、良（80分~90分）、中（60分~80分）、差（60分以下）4个评价等次，本项目综合评分为88.07分。

本次绩效评价的结果为良，并且绩效目标完成度高，实施过程管理严格，严格执行财务管理制度，资金监控到位，不存在违规现象。

总体来说，该项目开展工作良好，且绩效目标合理并符合和静县相关政策，做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金计划，不断提高资金使用效率。该项目绩效指标完成情况较好，建议以后保证财政资金对此类项目的投入，使财政资金达到最优化使用的效果。

九、其他需要说明的情况

该项目2021年预算资金到位及时，未影响项目进度，项目资金按计划使用。项目能够按时开展，并及时完成，总体完成质量较好。

本次绩效评价相关附件目录如下：

附件1：综合评分表

附件2：工作底稿

附件3：访谈报告

附件 4：满意度调查问卷报告

附件 1：综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
|--------|----|---------|----------------|----|-------|--------|--------|-----|
| A 项目决策 | 15 | A1 项目立项 | A101 战略目标适应性 | 5 | 适应 | 适应 | 100% | 5 |
| | | | A102 立项规范性 | 5 | 规范 | 不够规范 | 30% | 1.5 |
| | | A2 项目目标 | A201 绩效目标合理性 | 5 | 合理 | 不够合理 | 90% | 4.5 |
| B 项目过程 | 25 | B1 项目资金 | B101 预算编制合理性 | 3 | 合理 | 不够合理 | 66.67% | 2 |
| | | | B102 预算资金到位情况 | 3 | 足额、及时 | 足额、及时 | 100% | 3 |
| | | | B103 资金使用合规性 | 3 | 合规 | 合规 | 100% | 3 |
| | | | B104 财务管理 | 3 | 规范 | 规范 | 100% | 3 |
| | | B2 项目实施 | B201 组织机构 | 3 | 健全，明确 | 健全，明确 | 100% | 3 |
| | | | B202 预算执行率 | 3 | 100% | 76.75% | 76.75% | 2.3 |
| | | | B203 政府采购规范性 | 4 | 规范 | 规范 | 100% | 4 |
| | | | B204 档案管理完备性 | 3 | 完备 | 较完备 | 50% | 1.5 |
| C 项目产出 | 40 | C1 产出数量 | C101 装备乡村科普馆数量 | 8 | 5 座 | 5 座 | 100% | 8 |
| | | C2 产出质量 | C201 项目验收合格率 | 8 | 100% | 100% | 100% | 8 |
| | | C3 产出时效 | C301 项目计划开工率 | 8 | ≥95% | 100% | 100% | 8 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|------------|-----------------|-----|---------|-----------|--------|-------|
| | | | C302 项目计划完工率 | 8 | 100% | 100% | 100% | 8 |
| | | C4 产出成本 | C401 乡村科普馆装备成本 | 8 | ≤56 万/座 | 49.54 万/座 | 88.5% | 7.08 |
| D 项目效益 | 20 | D1 社会效益 | D101 提升基层群众服务水平 | 6 | 有效 | 达成目标 | 72.5% | 4.35 |
| | | D2 可持续影响指标 | D201 丰富群众科技文化知识 | 7 | 长期 | 达成目标 | 100% | 7 |
| | | D3 服务对象满意度 | D301 群众满意度 | 7 | ≥95% | 79.51% | 69.14% | 4.84 |
| 合计 | | | | 100 | | | 88.07% | 88.07 |

附件 2：工作底稿

A101 “战略目标适应性”评价底稿

绩效评价项目名称：和静镇乡村科普馆建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

| | |
|------|---|
| 指标解释 | 考察项目与部门战略目标的适应性 |
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：适应 |
| | 指标标杆值依据： 通用标准 |
| | 指标评分细则： 符合发展政策（1.5分）、符合区域优先发展重点（1.5分）和项目能够支持部门目标的实现（2分）得满分，否则不得分 |
| 数据来源 | 《中国科协关于进一步加强农村科普工作的意见》（科协发普字〔2005〕67号）《全民科学素质行动计划纲要 2021-2035 年》、《中华人民共和国科学技术普及法》 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： （1）《中国科协关于进一步加强农村科普工作的意见》（科协发普字〔2005〕67号）提出，以搭建农村社会化科普服务平台为主要工作方式，有效发挥科普工作主要社会力量的作用，动员、支持社会各方面力量共同开展科普工作，集成并共享科普资源，通过社会化的农村科普工作，普惠广大农民群众。《中华人民共和国科学技术普及法》第二十条规定，国家加强农村的科普工作。农村基层组织应当根据当地经济与社会发展的需要，围绕科学生产、文明生活，发挥乡镇科普组织、农村学校的作用，开展科普工作。各类农村经济组织、农业技术推广机构和农村专业技术协会，应当结合推广先进适用技术向农民普及科学技术知识。因此，本项目的实施符合发展政策，该项得 1.5 分。（2）《全民科学素质行动计划纲要 2021-2035 年》提出，提升革命老区，民族地区，边疆地区，脱贫地区农民科技文化素质。引导社会科普资源向欠发达地区农村倾斜。开展兴边富民行动、边境边民科普活动和科普边疆行活动，大力开展科技援疆援藏，提高边远地区农民科技文化素质。提升农村低收入人口职业技能，增强内生发展能力。本项目的实施符合区域优先发展重点，该项得 1.5 分。（3）本项目的实施能支持和静县和静镇人民政府“加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。”职能的体现，该项得 2 分。根据评分细则，该指标得 5 分。 |
| | 指标得分：5 |

日期：2022 年 7 月 20 日

A102 “立项规范性”评价底稿

绩效评价项目名称：和静镇乡村科普馆建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

| | |
|------|--|
| 指标解释 | 用以反映项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、和静县地区及部门的相关规定。 |
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：规范 |
| | 指标标杆值依据： 通用标准 |
| | 指标评分细则： ①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、立项评估、集体决策等； ②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣除权重分的 40%，缺②扣除权重分的 30%，缺③扣除权重分的 30% |
| 数据来源 | 《关于解决乡村科普馆启动建设资金的请示》（静党宣请字〔2021〕19号） |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： （1）该项目缺少项目可行性研究报告，未见相关会议记录，立项文件缺少，该项扣除 2 分（2）项目的申请文件及立项依据符合规定程序，该项不扣分。 （3）该项资金申请文件齐全，但缺少项目立项文件，项目申请批复资料，该项扣除 1.5 分。 依据评分细则，该指标得 1.5 分。 |
| | 指标得分：1.5 |

日期：2022 年 7 月 20 日

A201 “绩效目标设定合理性”评价底稿

绩效评价项目名称：和静镇乡村科普馆建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

| | |
|------|---|
| 指标解释 | 考察项目是否设立了绩效目标，以及绩效目标编制是否明确、可衡量、可达成、具有相关性和时限性 |
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：合理 |
| | 指标标杆值依据： 通用标准 |
| | 指标评分细则： 有绩效目标得权重分的 50%；再根据项目绩效目标是否编制明确、可衡量、可达成、具有相关性和时限性进行判断，每项各占权重分的 10%。 |
| 数据来源 | 项目支出绩效目标表、项目支出绩效监控表、项目支出绩效自评表 |
| 评价结果 | <p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>和静镇乡村科普馆建设项目设立了绩效目标，详情如下：装备乡镇科普馆数量 5 座，通过项目的开展，提升基层群众服务水平，使基层新时代文明实践示范站成为教育、引领、凝聚和服务各族群众的阵地。该项得 50% 权重分。该项目绩效目标编制明确、可达成、具有相关性和时限性。但效益指标“提升基层群众服务水平”“凝聚和服务各族群众”目标值设置“有效”“长期”，不可衡量，该项扣除 10% 权重分。</p> <p>根据评分规则，该指标得 4.5 分。</p> |
| | 指标得分：4.5 |

日期：2022 年 7 月 20 日

B101“预算编制合理性”评价底稿

绩效评价项目名称：和静镇乡村科普馆建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

| | |
|------|--|
| 指标解释 | 该指标考察项目预算编制是否合理，是考察项目立项合理性的重要指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 指标标杆值：合理 |
| | 指标标杆值依据： 通用标准 |
| | 指标评分细则： ①项目预算编制是否完整（1分）；②是否有明确、合理的编制依据，确定依据（1分）；③是否与绩效目标设置的水平相符（1分） |
| 数据来源 | 《关于解决乡村科普馆启动建设资金的请示》（静党宣请字〔2021〕19号）、乡镇科普馆建设统计表 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： ①项目预算编制完整，该项得1分；②按照乡镇科普馆建设统计表进行编制，有明确、合理的单价标准和数量确定依据，该项得1分；③根据资料可得，预算的编制与绩效目标设置的水平不太相符，项目申请预算资金280万元，实际招投标结束后，合同价为247.692397万元，有部分出入，该项扣除1分。根据评分细则，该指标得2分。 |
| | 指标得分：2 |

日期：2022 年 7 月 20 日

B102 “预算资金到位情况”评价底稿

绩效评价项目名称：和静镇乡村科普馆建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

| | |
|------|---|
| 指标解释 | 考察各层级预算资金及时、足额到位情况，用以反映资金的到位程度 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 指标标杆值：足额、及时 |
| | 指标标杆值依据： 通用标准 |
| | 指标评分细则： 资金拨付足额及时到位得3分；足额和及时各占1.5分。如不足额、不及时根据实际情况扣分。 |
| 数据来源 | 资金拨付文件 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 和静镇乡村科普馆建设项目，应到位预算资金为280万元，实际到位资金为280万元，资金到位率100%，资金到位及时，资金拨付足额到位。 依据评分细则，该项得3分。 |
| | 指标得分：3 |

日期：2022 年 7 月 20 日

B103 “资金使用合规性”评价底稿

绩效评价项目名称：和静镇乡村科普馆建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

| | |
|------|--|
| 指标解释 | 考察项目资金的各项使用是否符合标准，是否有违规支出资金使用 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 指标标杆值：合规 |
| | 指标标杆值依据： 通用标准 |
| | 指标评分细则： ①资金使用进度是否与项目进度相匹配（0.75分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.75分）；③预算资金的调整是否合理、合规（0.75分）；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.75分）；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（该项为扣分标准，不分配权重），出现任一违规现象则不得分。 |
| 数据来源 | 合同、记账凭证、财政直接支付凭证、《关于解决乡村科普馆启动建设资金的请示》（静党宣请字〔2021〕19号） |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： ①目前，各村科普馆项目均已验收完毕，广告设计，制作、展品定制、设备采购类，验收完毕，资金已支付完毕，其余项目按照合同要求支付资金，待审计完成后，支付剩余资金。支付情况均按照合同约定时间支付。故①项得1分；②一切开支，一律按照先报批后办办理的程序，提出资金申请《关于解决乡村科普馆启动建设资金的请示》（静党宣请字〔2021〕19号）。资金的拨付有完整的审批程序和手续，故②项得1分；③该项目不存在预算调整情况，故③项得0.5分；④经核查会计资料，资金的使用符合合同规定的用途，故④项得0.5分；⑤该项目未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，故⑤项不扣分。 依据评分细则，该项指标得3分。 |
| | 指标得分：3 |

日期：2022 年 7 月 20 日

B104 “财务管理”评价底稿

绩效评价项目名称：和静镇乡村科普馆建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

| | |
|-------------|--|
| 指标解释 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。资金管理、费用支出等制度是否健全、是否严格执行；会计核算是否规范 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 指标标杆值：规范 |
| | 指标标杆值依据： 资金管理办法 |
| | 指标评分细则： ①财务制度健全（1分），②严格执行制度（1分），③会计核算规范（1分） |
| 数据来源 | 记账凭证、财政直接支付凭证 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： （1）和静镇乡村科普馆建设项目，财务制度健全。在《和静镇人民政府财务管理制度》中，建设项目资金管理方面，明确了资金申请、拨付、审批等要求，财务制度健全，故①项得2分。（2）项目实施期间，和静镇人民政府严格执行财务收支审批、财务处理程序及财务信息公开等相关制度，财务制度健全故②项得1分。（3）拨款记录材料齐全，按要求保存会计凭证会计账簿和会计报表等所有会计核算的专业资料，会计核算规范，故③项得1分。根据指标评分细则，该指标得3分。 |
| | 指标得分：3 |

日期：2022 年 7 月 20 日

B201 “组织机构”评价底稿

绩效评价项目名称：和静镇乡村科普馆建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

| | |
|------|---|
| 指标解释 | 考察机构是否健全、分工是否明确 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 指标标杆值：健全，明确 |
| | 指标标杆值依据： 通用标准 |
| | 指标评分细则： 机构健全（1.5分）、分工明确（1.5分） |
| 数据来源 | 项目自评报告、访谈 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 为确保和静县和静镇人民政府该项目的顺利实施，和静县和静镇人民政府成立项目实施小组，组长：惠满发书记，副组长：巴力江·牙生镇长，王新柱副镇长、项目负责人为王新龙办公室，成员为朱英、巴都木加甫、2人，其中：巴力江·牙生负责监督跟进项目进度，王新柱负责与项目施工人员联系协商相关事宜工作，朱英负责收集基础资料、科普馆建设项目资金申报工作。 该项目组织机构健全，分工明确，依据评分细则，该指标得3分。 |
| | 指标得分：3 |

日期：2022 年 7 月 20 日

B202 “预算执行率”评价底稿

绩效评价项目名称：和静镇乡村科普馆建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

| | |
|------|--|
| 指标解释 | 反映项目预算资金的执行情况，判断投入的预算与实际比较情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 指标标杆值：100% |
| | 指标标杆值依据： 通用标准 |
| | 指标评分细则： 预算执行率=实际支出/项目预算金额×100%。 得分=预算执行率×权重。 |
| 数据来源 | 访谈、资金支付凭证、记账凭证 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 该项目申请预算资金为280万元，截至2021年12月，共支出214.9029万元。 预算执行率=214.9029/280=76.75%，依据评分细则，该指标得分=3*76.75%=2.3分。 |
| | 指标得分：2.3 |

日期：2022年7月20日

B203“政府采购规范性”评价底稿

绩效评价项目名称：和静镇乡村科普馆建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

| | |
|------|---|
| 指标解释 | 考察政府采购流程是否合规 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 指标标杆值：规范 |
| | 指标标杆值依据： 通用标准 |
| | 指标评分细则： 政府采购流程均按照相关制度规定进行、未出现违规现象得满分；有违规现象不得分 |
| 数据来源 | 中标通知书、合同 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 和静镇乡村科普馆建设项目五个村一个社区针对科普馆不同建设内容分别进行了招标，项目的招标投标流程符合《中华人民共和国政府采购法》规定。和静镇乡村科普馆建设项目的工程合同条款详尽，符合《中华人民共和国合同法》的规定。均在规定时间内按照要求签订合同 政府采购流程均按照制度规定进行，未发现违规现象。根据评分细则，该指标得4分。 |
| | 指标得分：4 |

B204 “档案管理完备性”评价底稿

绩效评价项目名称：和静镇乡村科普馆建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

| | |
|------|--|
| 指标解释 | 考察各项目档案整理的完备情况 |
| 指标权重 | 指标权重：3 |
| 评价标准 | 指标标杆值：完备 |
| | 指标标杆值依据： 通用标准 |
| | 指标评分细则： 各项目均对立项相关文件、绩效管理相关文件、管理制度文件、资金拨付相关材料等完备归档得满分，每出现一例未完备归档扣除权重分的 25%，扣完为止 |
| 数据来源 | 《关于解决乡村科普馆启动建设资金的请示》（静党宣请字〔2021〕19号）、项目支出绩效目标表、项目支出绩效监控表、项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告，和静县和静镇人民政府财务管理制度、财务支付凭证 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 和静镇乡村科普馆建设项目，缺少项目可行性研究报告，未见相关会议记录，立项文件缺少，故扣除 25%权重分，绩效管理的相关文件归档完整，管理制度文件缺少招投标文件，项目管理制度文件、故扣除 25%权重分，有资金申请及批复文件，资金拨付相关材料，根据评分细则，该指标得 1.5 分。 |
| | 指标得分：1.5 |

日期：2022 年 7 月 20 日

C101 “装备乡村科普馆数量”评价底稿

绩效评价项目名称：和静镇乡村科普馆建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

| | |
|-------------|---|
| 指标解释 | 反映“装备乡村科普馆数量”目标完成情况 |
| 指标权重 | 指标权重：8 |
| 评价标准 | 指标标杆值：5座 |
| | 指标标杆值依据： 计划标准 |
| | 指标评分细则： 得分=（业绩值/目标值）×指标权重 |
| 数据来源 | 项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告、合同、验收资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 该项目目标值为装备乡村科普馆5座，根据项目验收资料，五个村，一个社区科普馆建设均已完成验收，实际完成业绩值为装备乡村科普馆5座，根据评分规则，得分=（5座/5座）×8=8分。 |
| | 指标得分：8 |

日期：2022 年 7 月 20 日

C201“项目验收合格率”评价底稿

绩效评价项目名称：和静镇乡村科普馆建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

| | |
|------|--|
| 指标解释 | 考察“项目验收合格率”目标完成情况 |
| 指标权重 | 指标权重：8 |
| 评价标准 | 指标标杆值：100% |
| | 指标标杆值依据： 通用标准 |
| | 指标评分细则：得分=（业绩值/目标值）×指标权重。 |
| 数据来源 | 项目验收单 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 根据验收资料，验收合格，验收合格率达到100%。 根据评分规则，得分=（100%/90%）×8=8分。 |
| | 指标得分：8 |

日期：2022 年 7 月 20 日

C301 “项目计划开工率”评价底稿

绩效评价项目名称：和静镇乡村科普馆建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

| | |
|------|--|
| 指标解释 | 考察项目开工及时性情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：8 |
| 评价标准 | 指标标杆值：≥95% |
| | 指标标杆值依据： 通用标准 |
| | 指标评分细则： 根据项目实际完成情况评分，按时开工得5分；未按时开工，但不影响项目投入使用的得3分；未按时开工，且对项目交付使用造成影响的不得分。 |
| 数据来源 | 项目自评报告、访谈、合同 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 和静镇乡村科普馆建设项目按计划开工，依据评分细则，该指标得8分。 |
| | 指标得分：8分 |

日期：2022 年 7 月 20 日

C302 “项目计划完工率”评价底稿

绩效评价项目名称：和静镇乡村科普馆建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

| | |
|------|--|
| 指标解释 | 考察项目完工及时性情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：8 |
| 评价标准 | 指标标杆值：100% |
| | 指标标杆值依据： 通用标准 |
| | 指标评分细则： 根据项目实际完成情况评分，及时完成得5分；未按时完成，但不影响项目投入使用的得3分；未按时完成，且对项目交付使用造成影响的不得分。 |
| 数据来源 | 项目自评报告、访谈、项目验收单 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 根据项目验收资料，该项目五个村及一个社区科普馆建设均已验收完毕 根据评分规则，得分8分。 |
| | 指标得分：8分 |

C401 “乡村科普馆装备成本”评价底稿

绩效评价项目名称：和静镇乡村科普馆建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

| | |
|------|---|
| 指标解释 | 项目总成本是否超预算，是否按照支出标准进行支出 |
| 指标权重 | 指标权重：8 |
| 评价标准 | 指标标杆值：≤56 万/座 |
| | 指标标杆值依据： 通用标准 |
| | 指标评分细则： 指标评分细则：得分=（业绩值/目标值）×指标权重。 |
| 数据来源 | 资金支付凭证、记账凭证、访谈 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 和静镇乡村科普馆建设项目计划建设 5 座科普馆，预算 280 万元，每座科普馆 56 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际完成 5 座科普馆建设，投入资金 247.69 万元，每座科普馆 49.54 万元，根据评分细则，得分=(49.54/56)*8=7.08 分 |
| | 指标得分：7.08 |

日期：2022 年 7 月 20 日

D101 “提升基层群众服务水平”评价底稿

绩效评价项目名称：和静镇乡村科普馆建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

| | |
|------|--|
| 指标解释 | 考察社会效益的达成情况 |
| 指标权重 | 指标权重：6 |
| 评价标准 | 指标标杆值：有效 |
| | 指标标杆值依据： 通用标准 |
| | 指标评分细则： 根据调查问卷中关于“7.您对科普馆服务水平的评价是？”问题中，结果=(非常满意*100%+比较满意*60%+一般*30%+不满意*0%)*100%，结果95%以上为满分，之后每降低1%扣除2%权重分，（不含）60%以下不得分。 |
| 数据来源 | 问卷调查 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 据问卷调查分析，结果=(53.23%*100%+46.77%*0.6+0%*0.3+0%*0%)*100%=81.29%，依据评分细则，该项目得分=6-(95%-81.29%)*(6*2%)=4.35。 |
| | 指标得分：4.35分 |

日期：2022 年 7 月 20 日

D201 “丰富群众科技文化知识”评价底稿

绩效评价项目名称：和静镇乡村科普馆建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

| | |
|------|---|
| 指标解释 | 考察可持续影响指标的达成情况，是否改善了公共配套设施。 |
| 指标权重 | 指标权重：7 |
| 评价标准 | 指标标杆值：长期 |
| | 指标标杆值依据： 通用标准 |
| | 指标评分细则： 根据调查问卷中关于“您认为科普馆建设完成后，是否增长见识，学习了更多见识？”问题中，选择“是”的问卷占95%以上为满分，之后每降低1%扣除2%权重分，（不含）60%以下不得分。 |
| 数据来源 | 问卷调查 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 据问卷调查分析，选择“是”的问卷占100%，依据评分细则，该项目得分7分。 |
| | 指标得分：7 |

日期：2022 年 7 月 20 日

D301“群众满意度”评价底稿

绩效评价项目名称：和静镇乡村科普馆建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

| | |
|------|--|
| 指标解释 | 考察项目完成后，群众满意度情况， |
| 指标权重 | 指标权重：7 |
| 评价标准 | 指标标杆值：≥95% |
| | 指标标杆值依据： 通用标准 |
| | 指标评分细则： 根据调查问卷中关于“您对科普馆的整体评价是？”问题中，结果=(非常满意*100%+比较满意*60%+一般*30%+不满意*0%)*100%，结果95%以上为满分，之后每降低1%扣除2%权重分，(不含)60%以下不得分。 |
| 数据来源 | 问卷调查 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 据问卷调查分析，得分=(50%*100%+48.39%*0.6+1.61%*0.3+0%*0%)*100%=79.51%，依据评分细则，该项目得分=7-(95%-79.51%)*(7*2%)=4.84。 |
| | 指标得分：4.84分 |

日期：2022 年 7 月 20 日

附件 3：访谈报告

和静镇乡村科普馆建设项目访谈报告

一、访谈背景

（一）访谈目的

和静镇乡村科普馆建设项目，结合新时代文明实践中心（所、站、点）建设，实施文化润疆工程，在和静镇巩哈拉村、阿力腾布鲁克村、夏尔布鲁克村、克再村、查汗通古村建设科普馆，受益本村本乡牧民群众，为发展旅游业带来了效益，提高了牧民文化知识。

本次绩效评价访谈调研旨在通过现场访谈，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为和静镇乡村科普馆建设项目的提升改造建言献策。

（二）访谈对象和访谈内容

1. 访谈对象

项目主管部门：和静县和静镇人民政府

2. 访谈内容

（1）预算资金的总体情况、项目预算测算及预算资金拨付流程、项目实施过程、项目配套政策措施及项目发展规划等情况。（2）和静镇乡村科普馆建设项目的整体现状及规划安排、对项目经费的使用管理情况、项目成效等。

（3）项目实施过程中遇到的问题及做法

二、访谈分析

（一）项目背景

按照县党委安排部署，为进一步深化群众工作，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，结合新时代文明实践中心（所、站、点）建设，实施文化润疆工程，在和静镇巩哈拉村、阿力腾布鲁克村、夏尔布鲁克村、克再村、查汗通古村、科普馆建设项目资金建设科普馆，受益本村本乡牧民群众，项目建设为旅游业带来了效益，提高了牧民文化知识。

（二）项目组织架构

王新柱责全盘工作，王新龙负责内部控制，朱英负责基金监管、沟通协调工作，巴都木加甫负责项目申报工作、王新龙负责待遇审核、复核等工作，巴都木加甫负责资金申拨、项目进度跟踪等工作。

（三）项目实施

为强化社区居民的科教意识，确保村社区科普活动阵地更好地发挥作用：一是对村社区内大小宣传栏、宣传影像及时更新，丰富科普宣传健康教育宣传栏、计生宣传栏的宣传内容。二是充分利用社区配套的投影机、各类书刊、杂志等科教用品等。

附件 4：满意度调查问卷报告

和静镇乡村科普馆建设项目满意度分析报告

一、满意度调查背景

和静镇乡村科普馆建设项目，结合新时代文明实践中心（所、站、点）建设，实施文化润疆工程，在和静镇巩哈拉村、阿力腾布鲁克村、夏尔布鲁克村、克再村、查汗通古村建设科普馆，受益本村本乡牧民群众，为发展旅游业带来了效益，提高了牧民文化知识。

本次绩效评价社会调研旨在了解项目完成后的社会效益与受访人员满意度，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为和静镇乡村科普馆建设项目的提升改造建言献策。

二、研究设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为各村民众。

（二）调研内容

1. 调查对象的基本信息，包括：调查对象的姓名、年龄等基本情况。

2. 调查受访人员对和静镇乡村科普馆建设项目的观点，包括：每年一般参观科普馆的频率，村里的科普馆环境及基础设施是否完善，平时参观科普馆的主要目的，科普馆的活动是否丰富多彩，科普馆建设完成后，是否增长见识，学习了更多见识。

3. 调查受访人员对和静镇乡村科普馆建设项目的满意度，包括：对科普馆服务水平的评价、对科普馆的整体评价是。

4. 调查受访人员对和静镇乡村科普馆建设项目的意见和建议。

（三）调研方法

针对和静镇乡村科普馆建设项目受益群众开展问卷调查，具体问卷见附录 4-1。

（四）抽样方式

考虑到受益群众较广及疫情原因，人群密集不利于疫情防控，故本次问卷调查采用随机抽样法，通过“二维码”或“快捷链接”进行网上答卷。

（五）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员在和静县和静镇人民政府的协调配合下，组织安排问卷调查工作。

三、调研实施

（一）调研开展情况

根据项目进度安排，项目组于 2022 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 25 日，对和静县农牧民进行问卷的发放与回收。

（二）问卷回收情况

截至 2022 年 7 月 25 日，和静镇乡村科普馆建设项目问卷调研实际发放 62 份，本次共回收 62 份问卷，有效问

卷达 62 份，有效率 100%。


四、调查结果分析

（一）被调查对象个人信息分析

第 1 题：您的姓名

第 2 题：您的年龄


| 选项 | 小计 | 比例 |
|-----------|----|--------|
| 20 岁以下 | 1 | 1.61% |
| 20 岁-40 岁 | 20 | 32.26% |
| 40 岁-60 岁 | 35 | 56.45% |
| 60 岁以上 | 6 | 9.68% |
| 本题有效填写人次 | 62 | |



(二) 基本问题分析


3.您每年一般参观科普馆的频率是？ [多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--------|
| 从未 | 0 | 0% |
| 1次 | 0 | 0% |
| 2次 | 1 | 1.61% |
| 3次 | 12 | 19.35% |
| 4次及以上 | 50 | 80.65% |
| 本题有效填写人次 | 62 | |




4.您认为你们村的科普馆环境及基础设施是否完善？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--------|
| 是 | 61 | 98.39% |
| 否 | 1 | 1.61% |
| 本题有效填写人次 | 62 | |




5.您平时参观科普馆的主要目的是？ [多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--------|
| 学习科学知识 | 55 | 88.71% |
| 开阔视野 | 58 | 93.55% |
| 教育子女 | 60 | 96.77% |
| 路过顺便看看 | 58 | 93.55% |
| 完成任务 | 0 | 0% |
| 其他 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 62 | |

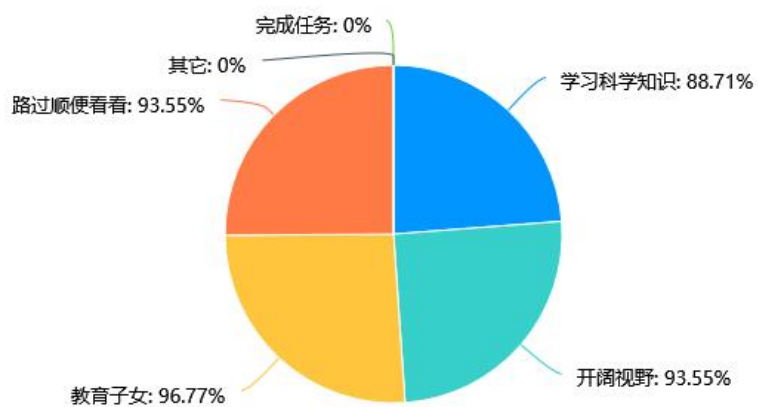


6.科普馆的活动是否丰富多彩? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--------|
| 非常丰富 | 28 | 45.16% |
| 比较丰富 | 30 | 48.39% |
| 一般 | 4 | 6.45% |
| 没什么活动 | 0 | 0% |
| 不清楚 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 62 | |




7.您对科普馆服务水平的评价是？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--------|
| 非常满意 | 33 | 53.23% |
| 比较满意 | 29 | 46.77% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 62 | |



8.您认为科普馆建设完成后，是否增长见识，学习了更多见识？ [单选题]


| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|------|
| 是 | 62 | 100% |
| 否 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 62 | |



(三) 满意度问题分析

9.您对科普馆的整体评价是？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--------|
| 非常满意 | 31 | 50% |
| 比较满意 | 30 | 48.39% |
| 一般 | 1 | 1.61% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 62 | |



10、您对科普馆建设还有哪些意见或建议？

(1) 有些仪器原理不太理解，希望再对一些讲解。

(2) 希望多增加科普仪器，更能提高孩子的兴趣。

附件 4-1

和静镇乡村科普馆建设项目满意度问卷调查

亲爱的先生/女士：

您好！受和静县财政局委托，我公司对 2021 年和静县和静镇乡村科普馆建设项目的满意度情况展开调研，感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 2 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆国融赛文企业管理咨

询服务管理有限公司

2022 年 7 月

1. 您的姓名？ [填空题] *

2. 您的年龄？ [单选题] *

20 岁以下

20 岁-40 岁

40 岁-60 岁

60 岁以上

3. 您每年一般参观科普馆的频率是？ [多选题] *

从未

1 次

2 次

3 次

4 次及以上

4.您认为你们村的科普馆环境及基础设施是否完善？ [单选题] *

是

否

5.您平时参观科普馆的主要目的是？ [多选题] *

学习科学知识

开阔视野

教育子女

路过顺便看看

完成任务

其他 _____ *

6.科普馆的活动是否丰富多彩？ [单选题] *

非常丰富

比较丰富

一般

没什么活动

不清楚

7.您对科普馆服务水平的评价是？ [单选题] *

非常满意

比较满意

一般

不满意 _____ *

8.您认为科普馆建设完成后，是否增长见识，学习了更多见识？ [单选题] *

是

否

9.您对科普馆的整体评价是？ [单选题] *

非常满意

比较满意

一般

不满意 _____ *

10.您对科普馆还有哪些意见或建议？ [填空题]
